


InSuFloor

Checklist

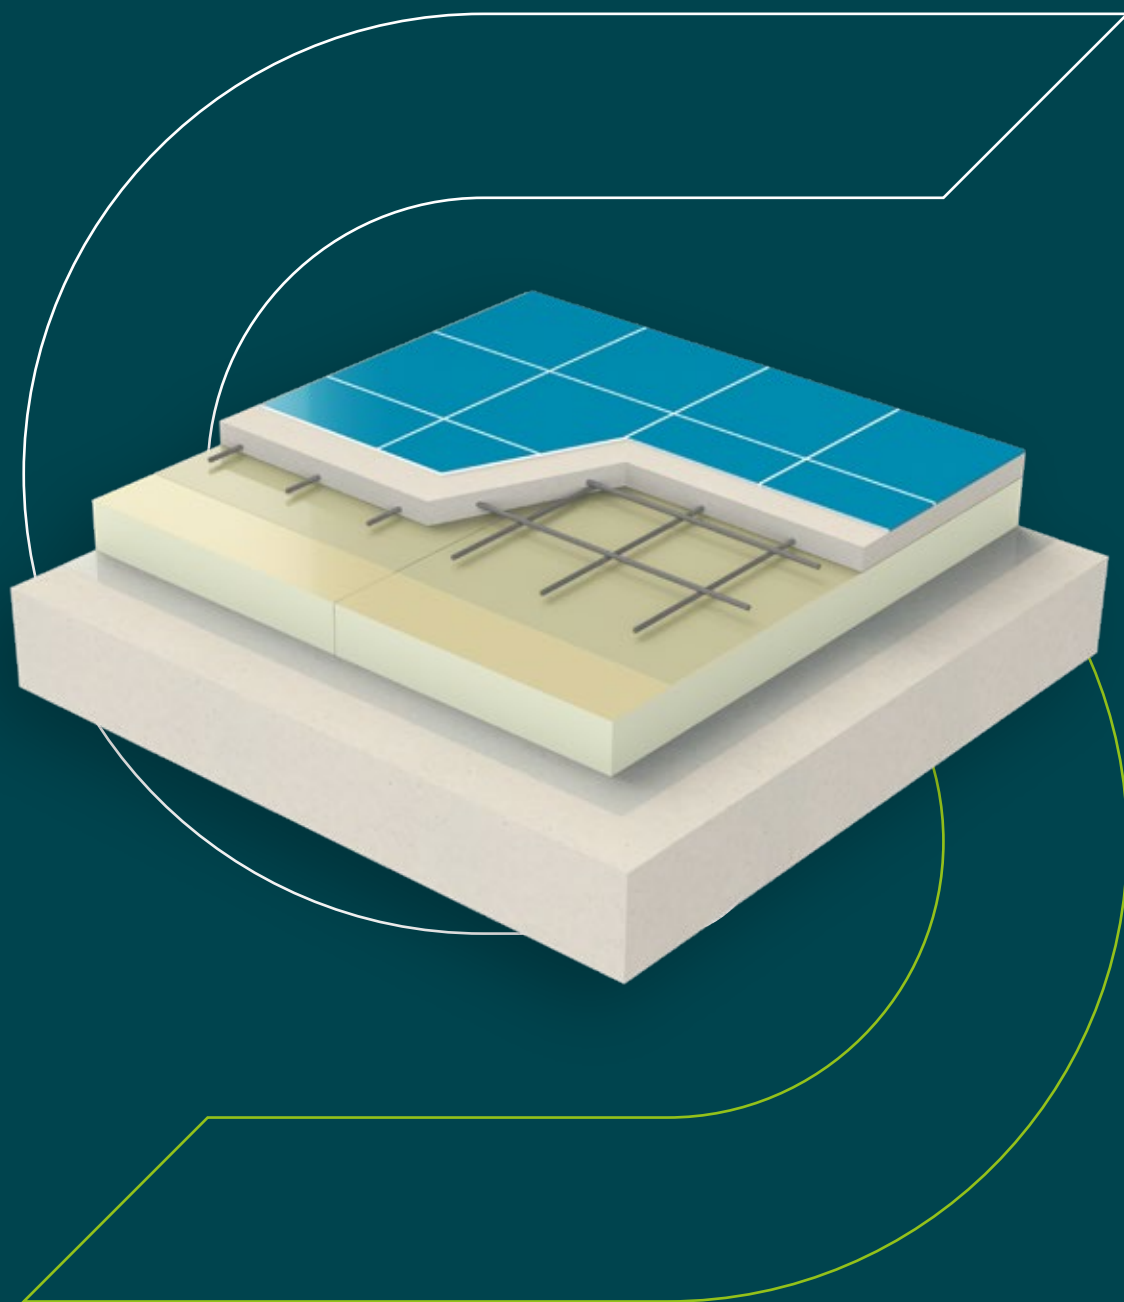

www.insus.nl

inSus[®]

Checklist Wet kwaliteitsborging voor InSuFloor vloerisolatie.

Project:

Uitvoering:

Datum:

Werkvoorbereiding

Zijn er bijzonderheden in het bouwplan welke invloed kunnen hebben op de isolatie of isolatiewaarde?

- Ja:** Noteer ze, inclusief hoe ermee wordt omgegaan en bespreek dit met de verantwoordelijke van het projectteam en de kwaliteitsborger, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Geen actie nodig.
-

Is er een Rc-berekening gemaakt?

** Op onze website is een Rc-calculator beschikbaar (www.insus.nl).*

- Ja:** Toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, stel Rc-waarde berekening conform NTA 8800:2023 op, toevoegen aan projectdossier.
-

Is er een bouwfysische berekening gemaakt?

- Ja:** Toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, afstemmen met opdrachtgever, indien nodig berekening opstellen en toevoegen aan projectdossier.
-

Is het isolatieprincipe geborgd (doorlopende dampremmer en isolatie)?

- Ja:** Bespreek dit met de verantwoordelijke van het projectteam, details en tekeningen toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, stel details op wanneer deze missen, controleer op juistheid, bespreek dit met de verantwoordelijke van het projectteam, toevoegen aan projectdossier.
-



Zijn er project specifieke risico's?

- Ja:** Bespreek ze met het uitvoeringsteam en opdrachtgever, benoem risico's, borg uitvoering, maak foto's of andere vorm van bewijslast, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Geen actie nodig.
-

Levering en opslag

Is bij de levering van de InSuFloor platen een controle gedaan op het juiste product, beschadigingen en non-conformiteit en zijn de juiste documenten ontvangen (pakbon, verwerkingsvoorschrift, etc.)?

** Indien nodig moet er nieuw en het correcte materiaal worden geleverd.*

- Ja:** Maak foto's van de documenten en materialen, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, neem contact op met leverancier voor juiste documenten en/of producten. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier.
-

Zijn de InSuFloor platen beschermt tegen weersinvloeden en vlak en vrij van de grond opgeslagen?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, sla producten op volgens verwerkingsvoorschriften, foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Toepassing

Is de ondergrond geschikt voor het toepassen van InSuFloor (schoon, droog, vlak en luchtdicht, etc.)?

- Ja:** Maak foto's van de ondergrond (details & overzichtsfoto's), toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, afstemmen met opdrachtgever. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Als detailtekeningen beschikbaar zijn gesteld en beoordeeld, voldoet de uitvoering hieraan?

- Ja:** Maak foto's van de uitgevoerde details, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, afstemmen met opdrachtgever. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Zijn er andere bouwdelen die ervoor zorgen dat de InSuFloor platen niet volledig kunnen worden aangebracht, zoals bijvoorbeeld fundering en doorvoeren?

- Ja:** Onderneem actie, maatregelen nemen en vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Geen actie nodig.
-

Is de tweede laag horizontaal verspringend aangebracht ten opzichte van de eerste laag (van toepassing bij dubbellaags systeem)?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Montage

Wordt er een PE folie onder en boven de InSuFloor platen aangebracht met een overlap van minimaal 100 mm? Wordt de PE folie opgezet tot boven het afgewerkte peil bij de aansluitingen op muren en andere bouwdelen?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Worden de plaatnaden verspringend, min. 200 mm, bijvoorbeeld halfsteensverband, aangebracht?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Worden alle openstaande naden en kieren, ook aansluitingen met muren (wanneer strakke aansluiting niet mogelijk is) afgedicht met flexibel blijvend PUR-schuim?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Wordt er bewapening aangebracht op de InSuFloor palen voor afwerkvloer, tevens ter voorkoming van drijven van de InSuFloor platen?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

**Voor dit product
zijn ook verwerkings-
voorschriften
beschikbaar.**

> Download deze op
www.insus.nl



inSus[®]

Roelofshoeweg 28
6921 RG Duiven

T 085 – 064 58 65
E info@insus.nl
