


InSuWall

Checklist

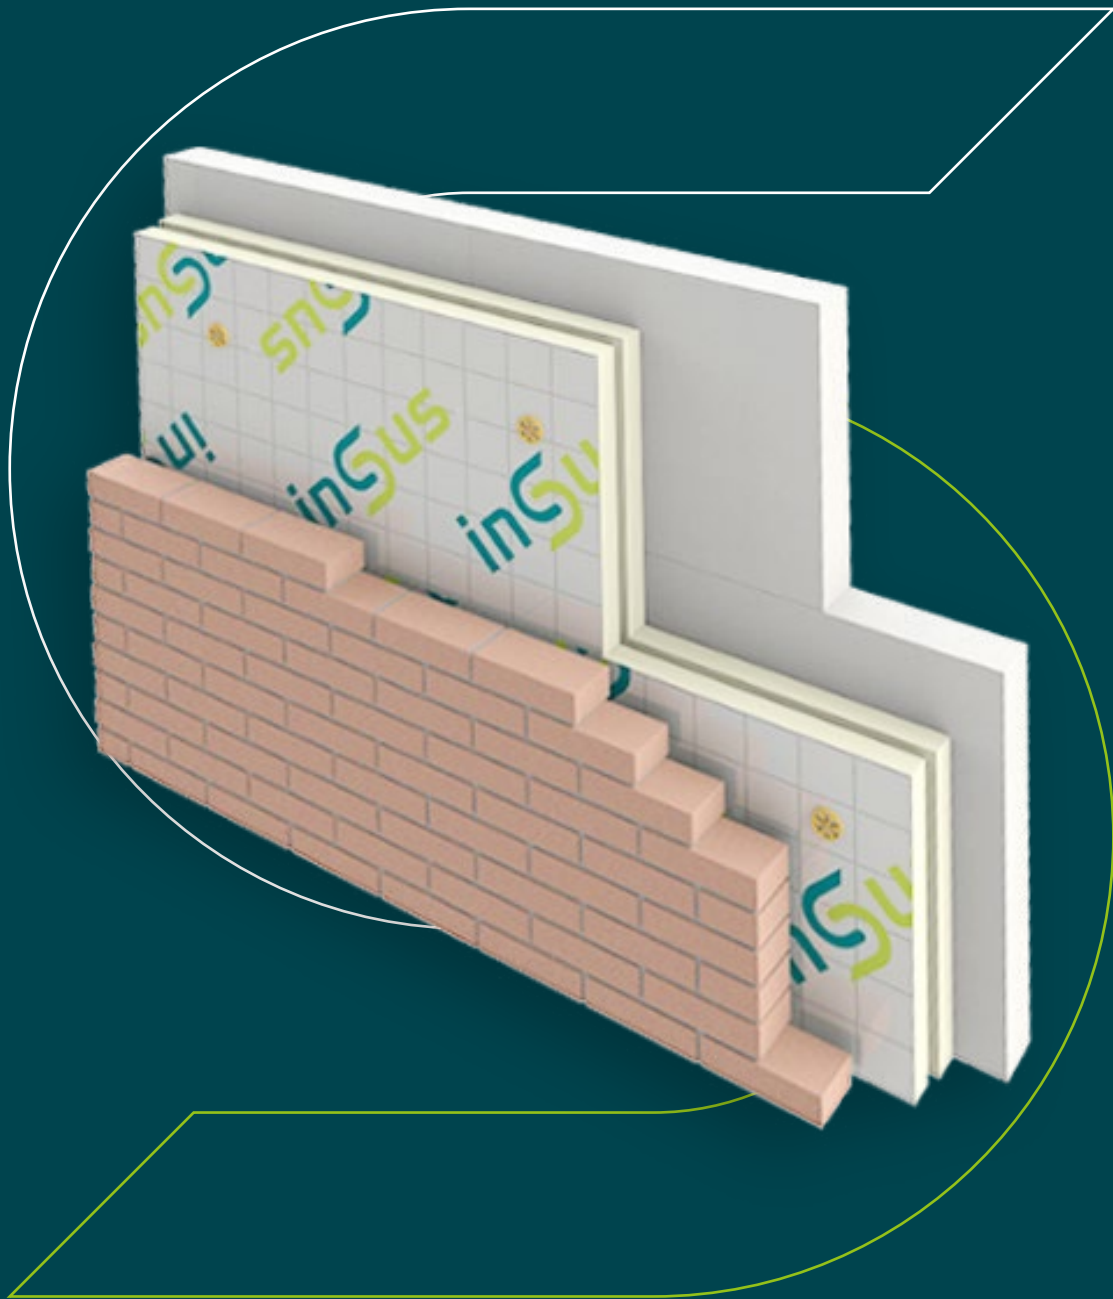

www.insus.nl/insuwall

inSus®

Checklist Wet kwaliteitsborging voor InSuWall spouwisolatie

Project:

Uitvoering:

Datum:

Werkvoorbereiding

Zijn er bijzonderheden in het bouwplan welke invloed kunnen hebben op de isolatie of isolatiewaarde?

- Ja:** Noteer ze, inclusief hoe ermee wordt omgegaan en bespreek dit met de verantwoordelijke van het projectteam en de kwaliteitsborger, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Geen actie nodig.
-

Is er een spouwankeradvies gemaakt?

- Ja:** Bespreek dit met de verantwoordelijke van het projectteam, voeg deze toe aan het projectdossier.
 - Nee:** Afstemmen met de constructeur en kwaliteitsborger. Indien nodig advies laten maken en toevoegen aan projectdossier.
-

Is er een Rc-berekening gemaakt?

** Op onze website is een Rc-calculator beschikbaar (www.insus.nl).*

- Ja:** Toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, stel Rc-waarde berekening conform NTA 8800:2023 op, toevoegen aan projectdossier.
-

Is er een bouwfysische berekening gemaakt?

- Ja:** Toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, afstemmen met opdrachtgever, indien nodig berekening opstellen en toevoegen aan projectdossier.
-



Zijn er project specifieke risico's?

- Ja:** Bespreek ze met het uitvoeringsteam en opdrachtgever, benoem risico's, borg uitvoering, maak foto's of andere vorm van bewijslast, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Geen actie nodig.
-

Levering en opslag

Is bij de levering van de InSuWall platen een controle gedaan op juiste product, beschadigingen en non-conformiteit en zijn de juiste documenten ontvangen (pakbon, verwerkingsvoorschrift, etc.)?

** Indien nodig moet er nieuw en het correcte materiaal worden geleverd.*

- Ja:** Maak foto's van de documenten en materialen, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, neem contact op met leverancier voor juiste documenten en/of producten. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier.
-

Zijn de InSuWall platen beschermt tegen weersinvloeden en vlak en vrij van de grond opgeslagen?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, sla producten op volgens verwerkingsvoorschriften, foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Toepassing

Is de ondergrond geschikt voor het toepassen van het product (schoon, droog, vlak en luchtdicht, etc.)?

- Ja:** Maak foto's van de ondergrond (details & overzichtsfoto's), toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, afstemmen met opdrachtgever. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Als detailtekeningen beschikbaar zijn gesteld en beoordeeld, voldoet de uitvoering hieraan?

- Ja:** Maak foto's van de uitgevoerde details, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, afstemmen met opdrachtgever. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Montage

Zijn de inSuWall platen vrijgehouden van de bovenkant van de fundering (min. 50 mm)?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Is de eerste isolatielaag waterpas aangebracht?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Worden de plaatnaden verspringend, bijvoorbeeld halfsteensverband, aangebracht?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Wordt de InSuWall met tong en groef afwaterend (tong naar boven) geplaatst?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Sluiten de InSuWall platen goed aan (geen valse luchtsponw) op het binnenblad en andere bouwdelen, zoals hoeken en kozijnen?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Sluiten de InSuWall platen onderling goed aan?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Worden alle openstaande naden en kieren dichtgezet (wanneer strakke aansluiting niet mogelijk is) met flexibel blijvend PUR-schuim?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Zijn er andere bouwdelen die ervoor zorgen dat de InSuWall platen niet volledig kunnen worden aangebracht, zoals bijvoorbeeld ankers, bevestigers, hemelwaterafvoeren of andere koudebruggen in de spouw aanwezig?

- Ja:** Onderneem actie, maatregelen nemen en vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Geen actie nodig.
-

Is de tweede laag horizontaal verspringend aangebracht ten opzichte van de eerste laag (van toepassing bij dubbellaags systeem)

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Worden de plaatnaden afgetapet?

** Volg de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant of leverancier van het tape. Het aftapen van naden en kieren is niet verplicht, maar dit kan voorgeschreven of geadviseerd worden.*

- Ja:** Foto's maken van de toepassing en de toegepaste tape (merk/type), toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Geen actie nodig.
-

Wordt de aangebrachte InSuWall bij werkonderbreking beschermd tegen weersinvloeden?

- Ja:** Foto's maken van deze bescherming, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Wordt het buitenblad vrij van de InSuWall platen geplaatst?

** Er dient minimaal 20 mm vrije luchtpouwruimte tussen binnenblad en isolatie te zijn.*

- Ja:** Foto's maken met afmetingen, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Bevestiging

Worden het juiste aantal en type spouwpluggen en ankers toegepast volgens verwerkingsvoorschrift van de InSuWall?

** Wij adviseren om kunststof spouwpluggen i.c.m. RVS spouwankers te gebruiken.*

- Ja:** Maak foto's van verwerkingstekening, etiket van doos bevestigingsmiddelen en de uitvoering, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, afstemmen met werkvoorbereiding, regel juiste documenten en bevestigingsmiddelen, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Worden het juiste aantal en type spouwpluggen en ankers toegepast volgens verwerkingsvoorschrift van de InSuWall?

** Wij adviseren om kunststof spouwpluggen i.c.m. RVS spouwankers te gebruiken.*

- Ja:** Maak foto's van verwerkingstekening, etiket van doos bevestigingsmiddelen en de uitvoering, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, afstemmen met werkvoorbereiding, regel juiste documenten en bevestigingsmiddelen, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Worden de passtukken (kleiner dan een halve InSuWall plaat) met minimaal twee spouwankers (pluggen) bevestigd?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

Worden de spouwpluggen en ankers op lagenmaat geplaatst?

- Ja:** Maak foto's, toevoegen aan projectdossier.
 - Nee:** Onderneem actie, train het uitvoeringsteam. Afspraken en maatregelen vastleggen in projectdossier, na aanpassingen foto's toevoegen aan projectdossier.
-

**Voor dit product
zijn ook verwerkings-
voorschriften
beschikbaar.**

> Download deze op
www.insus.nl

